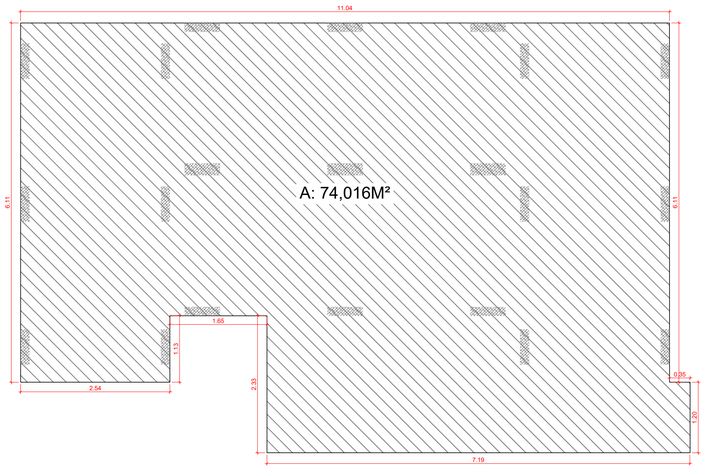

1 IMPLANTAÇÃO

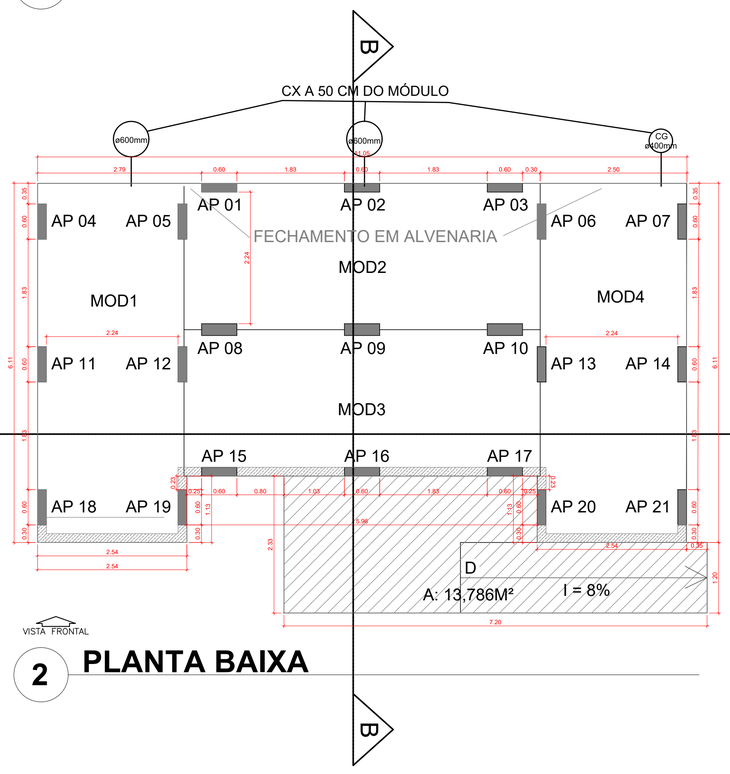

2 PLANTA BAIXA



3 VISTA FRONTAL



4 VISTA LATERAL



5 CORTE A-A



7 PLANTA BAIXA - RAMPA



6 CORTE B-B



8 VISTA FRONTAL - RAMPA

O material técnico apresentado é de responsabilidade da empresa Metal Módulos, que elaborou o mesmo.

ENG. ANDERSON DE SOUZA MELO
CONTATO (11) 97326-7982

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- RADIER COM ESPESSURA DE 12 CM;
- RADIER COM MALHA DUPLA 10X10;
- RADIER COM 21 APOIOS SENDO ELES DE 0,15 X 0,60, SALVO OS AP 08,09 E 10 QUE SERÃO DE 0,20 E 0,60;
- RAMPA DE 4,20M COM INCLINAÇÃO DE 8%;
- FECHAMENTO DE ALVENARIA ENTRE OS APOIOS DE 15CM (0,15M) APENAS NA VISTA FRONTAL;
- A CONCRETAGEM DOS APOIOS DEVERÃO SER FEITA JUNTO COM O RADIER (BLOCO ÚNICO) DE CONCRETO ARMADO MACIÇO;
- A RAMPA É MAIS ALTA DO QUE OS APOIOS, POIS É A DIFERENÇA ENTRE A ALTURA DO PISO DO CONTAINER, E O APOIO EM SI. PARA QUE O PISO E O PLATÔ DA RAMPA ESTEJAM ALINHADOS;
- É RECOMENDADO QUE OS VÃOS PARA VENTILAÇÃO TENHAM TELAS PROTETORAS PARA QUE NÃO HAJA A ENTRADA DE INSETOS/ANIMAIS, E LIXO;
- RAMPA DE ACESSIBILIDADE, DEVERÁ ATENDER OQUE PRECONISA NA NRB 9050/2021.

Secretaria de Estado da Saúde

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

metal MÓDULOS
MÓDULOS METÁLICOS HABITACIONAIS
Av. Heinrich Reismann, nº57, Jardim Bela Vista
Bom Jesus dos Perdões–SP Cep 12955–000
Tel. (11)4012–4662 Tel. (11)4414–6461

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, nº.188, 3ºandar
São Paulo–SP Cep 05403–000
Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

UNIDADE	RADIER_PROGRAMA_–_MEU_PET
TIPO	RADIER
REFERÊNCIA	
	PROJETO_EXECUTIVO_RADIER
CÓDIGO DO EDIFÍCIO	RAD01–PAD_V2
FOLHA	ÚNICA
ÁREA	73,255M²
ESCALA	1:50
DATA	01/02/2022
ARQUIVO	RADIER_CP01_PAD_V1.DWG

C.E.O. – METAL MÓDULOS HABITACIONAIS
Simone A. Mathias Pereira
ENGENHEIRA
Eng. Cayque J. Mathias Andrade
DIRETOR DO G.T.E.:
AUTORA DO PROJETO
